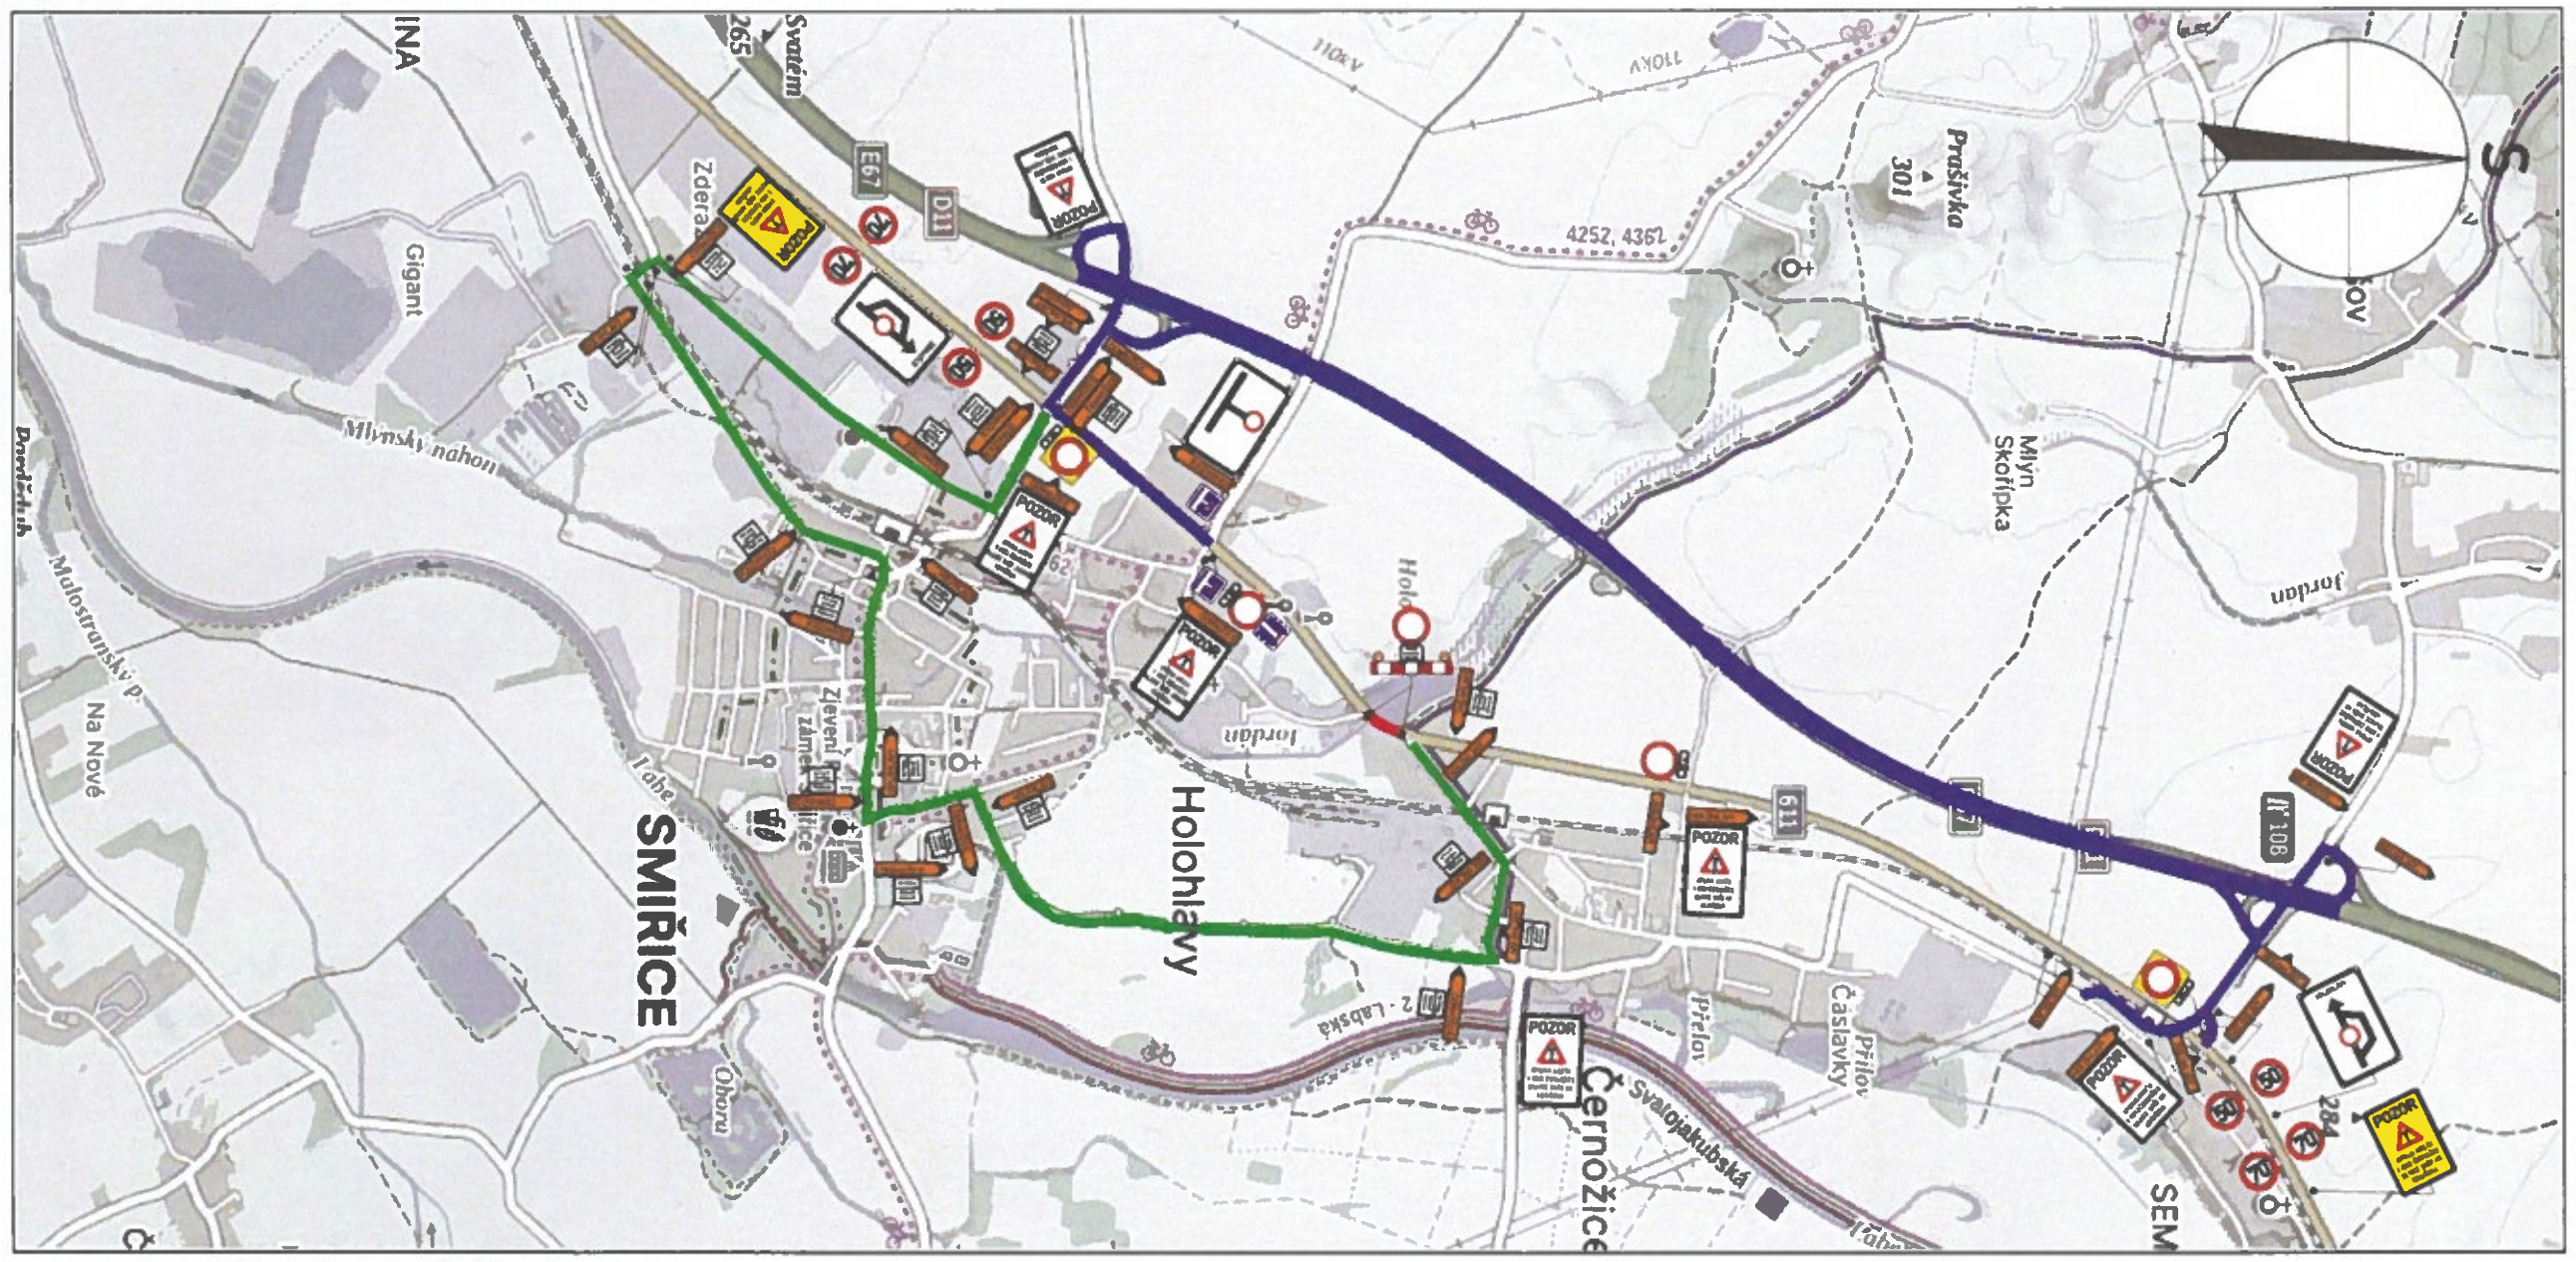

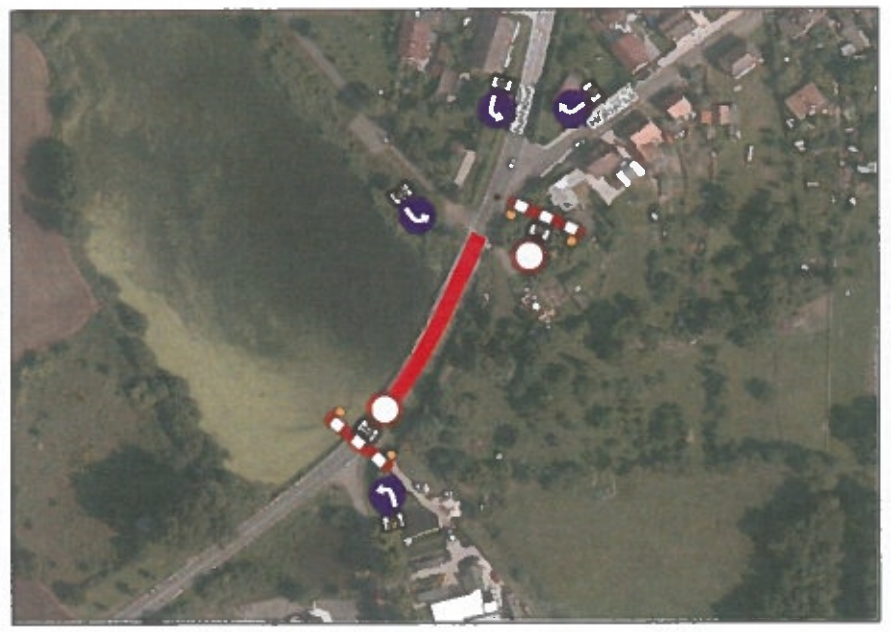

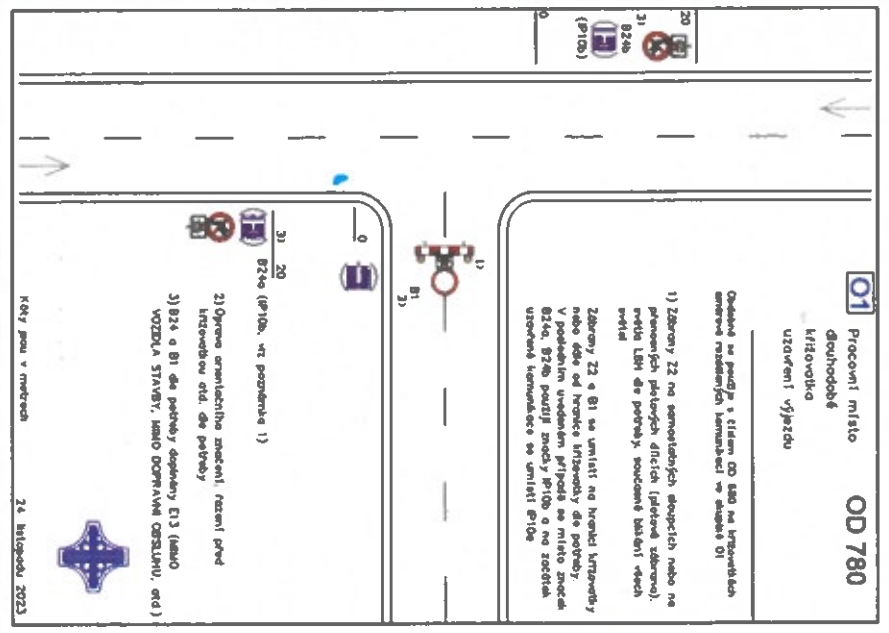

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Navržená úprava provozu řeší dopravní situaci při opravě mostu ev.č. 33 - 008, u obce Černožice (okr. Hradec Králové).

Návrh DIO je v souladu s příručkou označování pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy, všeobecná část a schematická řada S a O. Jako základní schéma je navrženo OD 780 po úpravě.

Pěší provoz bude převeden na provizorní lávku.

Objízdná trasa je navržena z obce Černožice po silnici II/611, dále III/2858 k Exitu 108 na D11, u Exitu 104 je navedena III/3089 směr Smiřice a na II/611 směr Holohlavy, a to obousměrně.

Alternativní trasa pro vozidla s konstrukční rychlostí menší než 80 km/hod., je vedena jižně po III/3089Smiřice, III/30810 a Holohlavy III/2998, a to rovněž obousměrně.

- OBJÍZDNÁ TRASA < 80 km/hod
- OBJÍZDNÁ TRASA
- UZAVÍRKA

Souhlasíme s návrhem přechodné úpravy provozu, uzavírkou a zvláštním užíváním. Zároveň se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

CH&T PARDUBICE
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Objednatel

Autor projektu	DIOZ - dopravní značení	
Kreslil	Jaroslav Michek - 777 814 646	
Kraj: Královéhradecký	Okres: Hradec Králové	Obec: Černožice

Akce:

II/611, ČERNOŽICE
OPRAVA MOSTU 33 - 008
15.6. - 15.12. 2026

DIOZ

Datum	05/2026
Stupeň PD	DIO
Měřítko	
Formát	4xA4
